



Informe de resultados

Unidad de Promoción y Desarrollo

“Diputación de Cáceres 2011”

Diciembre 2009 – Diciembre 2011

2011

Contenido

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	2
2. RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO.	3
3. METODOLOGÍA.....	4
4. ACTUACIONES	4
5. INDICADORES DE RESULTADOS 1ª FASE	6
6. INDICADORES DE RESULTADOS 2ª FASE	7
7. INDICADORES DE RESULTADOS 3ª FASE	9
8. INDICADORES DE RESULTADOS 4ª FASE	10
9. PRODUCTOS Y PUBLICACIONES	11

INFORME DE RESULTADOS

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN

Tipo de proyecto:	Unidad de Promoción y Desarrollo.
Denominación:	“Diputación de Cáceres 2011”.
Entidad Promotora:	Organismo Autónomo para el Desarrollo Local (OADL) de la Diputación de Cáceres.
Entidades Financiadoras:	Junta de Extremadura, Fondo Social Europeo y OADL de la Diputación de Cáceres.

LOCALIZACIÓN

Dirección:	Organismo Autónomo para el Desarrollo Local (Unidad de Promoción y Desarrollo).
Calle/plaza:	c/ Pintores, nº 10.
Código Postal:	10001.
Localidad:	Cáceres.
Nº Teléfono:	927.255.660.
Nº Fax:	927.255.606.
Correo electrónico:	upd@oadl.es.
Pág. web:	www.oadl.es.

TEMPORALIZACIÓN

Duración:	24 meses
Fecha de Inicio:	18/12/2009
Fecha de finalización:	17/12/2011

UPD	1ª fase	2ª fase	3ª fase	4ª fase	Duración Total
F. inicio	18/12/2009	18/06/2010	18/12/2010	18/06/2011	18/12/2011
F. fin	17/06/2010	17/12/2010	17/06/2011	17/12/2011	17/12/2011

2. RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO.

La Unidad de Promoción y Desarrollo “Diputación de Cáceres 2011” está integrada por quince personas, distribuidas en una dirección de proyecto, trece perfiles técnicos y un puesto como personal de apoyo (administración).


El actual **organigrama** se muestra en el cuadro siguiente:

ORGANIGRAMA DE LA UPD “DIPUTACIÓN DE CÁCERES 2011”



3. METODOLOGÍA.

Todo el proyecto está planificado bajo parámetros de calidad, por lo que la línea conductora de las actuaciones que se han llevado a cabo seguirá el orden que se plantea en el mapa de procesos y procedimientos de la Unidad que se muestra a continuación.

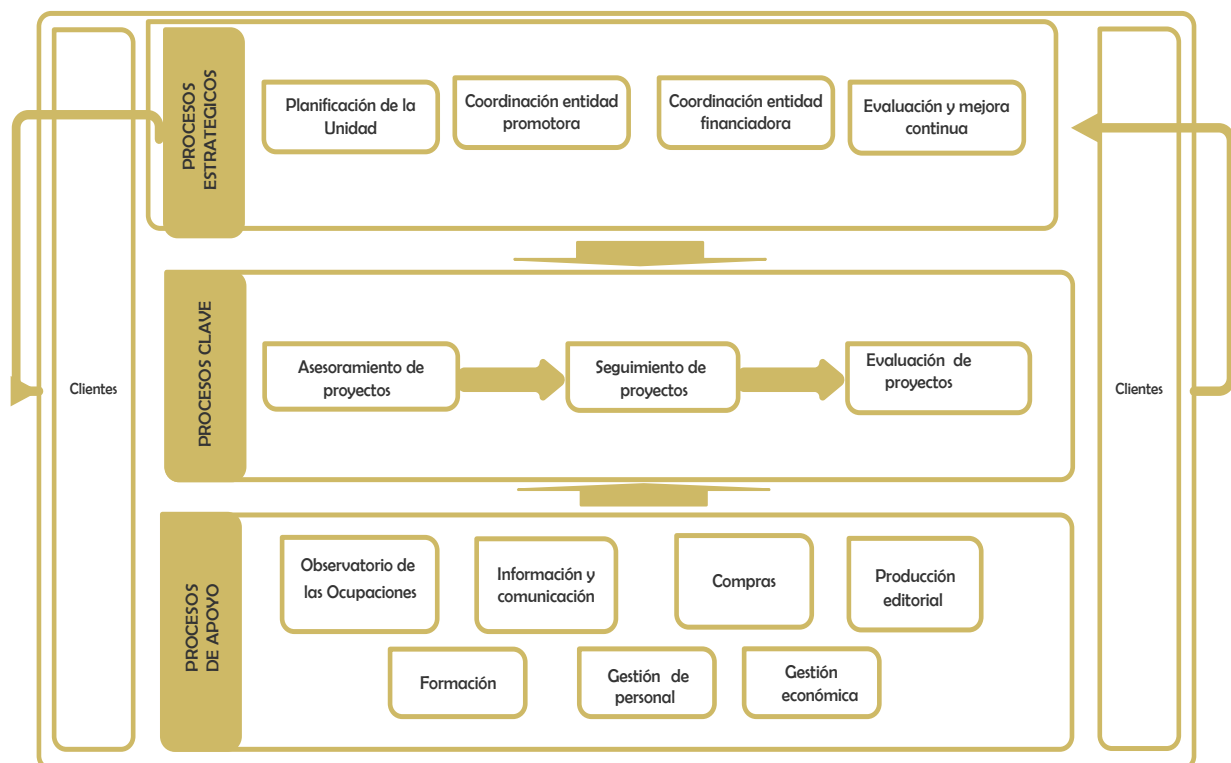

4. ACTUACIONES

4.1. Asesoramiento a EP de proyectos ETCOTE.

Proporcionar apoyo técnico a la Entidad Promotora durante el diseño y elaboración del proyecto de ETCOTE.

4.2. Seguimiento proyectos ETCOTE activos.

4.2.1. Sesiones de Inicio:

Presentar la Unidad de Promoción y Desarrollo todos los Proyectos ETCOTE aprobados, explicar sus funciones, servicios y plantear las acciones de seguimiento que se llevarán a cabo en cada uno de ellos.

4.2.2. Sesiones de Seguimiento:

El objetivo de este procedimiento es planificar las visitas a todos los proyectos ETCOTE en su final de fase, para:

- Apoyar desde el punto de vista técnico y formativo al equipo técnico
- Motivar al alumnado hacia la búsqueda de empleo cuando coincida con la finalización del proyecto.

4.2.3. Sesiones de Finalización

El objetivo de este procedimiento es planificar las visitas a todos los proyectos ETCOTE al finalizar la última fase del proyecto para evaluar los resultados del mismo.

4.2.4. Prestación de Servicios desde UPD.

- Facilitamos información general en materia de formación para el empleo.
- Proporcionamos documentación de apoyo necesaria para elaborar proyectos ETCOTE.
- Elaboramos o adaptamos itinerarios formativos a demanda de las entidades promotoras y/o equipos técnicos de proyectos ETCOTE.
- Evaluamos la idoneidad de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo de los proyectos ETCOTE.
- Revisamos los borradores de proyectos ETCOTE elaborados por las Entidades Promotoras.
- Habilitamos alojamientos web y correo electrónico a proyectos ETCOTE en activo

- Facilitamos a los equipos técnicos de los proyectos ETCOTE recursos bibliográficos para la impartición de la formación.
- Impartimos módulos de formación complementaria en los proyectos ETCOTE en ausencia de recursos en el territorio.
- Difundimos información y noticias actualizadas de interés de y para los participantes de los proyectos ETCOTE.
- Resolvemos consultas y dudas de carácter técnico y de gestión surgidas en el desarrollo de los proyectos.

5. INDICADORES DE RESULTADOS 1ª FASE

INDICADORES DE RESULTADOS	
PLANIFICADOS	ALCANZADOS
• N° reuniones planificadas con OADL: 22	• N° reuniones realizadas con OADL:22
• Informes semestrales planificados: 1	• Informes semestrales realizados: 1
• N° reuniones coordinación técnica de UPD planificadas: 10	• N° reuniones de coordinación técnica UPD realizadas: 10
• N° de asesoramientos solicitados por Entidades Promotoras en esta fase: 43	• N° Asesoramientos a EP realizados en esta fase: 40
• N° cuestionarios satisfacción asesoramientos a EP realizados: 39	• N° de cuestionarios satisfacción asesoramiento a EP recibidos: 27
• N° sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE planificadas: 18	• N° sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE realizadas: 18
• N° informes sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE planificados: 18	• N° informes sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE realizados: 18
• N° sesiones inicio con alumnado ETCOTE planificadas: 18	• N° sesiones inicio con alumnado ETCOTE realizadas: 18
• N° informes sesiones inicio con alumnado	• N° informes sesiones inicio con

ETCOTE planificados: 18	alumnado ETCOTE realizados : 18
<ul style="list-style-type: none"> Nº de cuestionarios de evaluación inicio ETCOTE 1)2008 planificados: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de cuestionarios de evaluación inicio ETCOTE 1)2008 cumplimentados, recogidos y tabulados: 18
<ul style="list-style-type: none"> Nº de Informes de Evaluación ETCOTE 2)2009 planificados: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes de Evaluación ETCOTE realizados: 18
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas de seguimiento a proyectos ETCOTE planificadas: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas de seguimientos a proyectos ETCOTE realizadas: 8
<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes de seguimiento planificados: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes de seguimiento realizados: 8
<ul style="list-style-type: none"> Nº de revisiones Plan de Inserción Laboral previstos : 26 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de revisiones Plan de inserción Laboral realizados: 12
<ul style="list-style-type: none"> Nº de seguimientos Plan de Inserción laboral previstos: 26 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de seguimientos Plan de Inserción laboral realizados: 8
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (inserción) programaciones 1)2008 y 1)2009 previstas: 12 	<ul style="list-style-type: none"> Nº visitas finalización (inserción) realizadas: 12
<ul style="list-style-type: none"> Nº informes de viabilidad demandados por DGFE: 44 	<ul style="list-style-type: none"> Nº informes de viabilidad para DGFE realizados: 44
<ul style="list-style-type: none"> Nº informes de valoración demandados por DGFE: 41 	<ul style="list-style-type: none"> Nº informes de valoración elaborados para DGFE: 41

6. INDICADORES DE RESULTADOS 2ª FASE

INDICADORES DE RESULTADOS	
PLANIFICADOS	ALCANZADOS
<ul style="list-style-type: none"> Nº reuniones planificadas con OADL: 22 	<ul style="list-style-type: none"> Nº reuniones realizadas con OADL: 22
<ul style="list-style-type: none"> Informes semestrales planificados: 1 	<ul style="list-style-type: none"> Informes semestrales realizados: 1
<ul style="list-style-type: none"> Nº reuniones coordinación técnica de 	<ul style="list-style-type: none"> Nº reuniones de coordinación técnica

UPD planificadas: 8	UPD realizadas: 14
<ul style="list-style-type: none"> Nº de asesoramientos solicitados por Entidades Promotoras en esta fase: 33 	<ul style="list-style-type: none"> Nº Asesoramientos a EP realizados en esta fase: 33
<ul style="list-style-type: none"> Nº cuestionarios satisfacción asesoramientos a EP planificados: 33 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de cuestionarios satisfacción asesoramiento a EP realizados: 0
<ul style="list-style-type: none"> Nº sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE planificadas: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Nº sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE realizadas: 18
<ul style="list-style-type: none"> Nº informes sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE planificados: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Nº informes sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE realizados: 14
<ul style="list-style-type: none"> Nº sesiones inicio con alumnado ETCOTE planificadas: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Nº sesiones inicio con alumnado ETCOTE realizadas: 18
<ul style="list-style-type: none"> Nº informes sesiones inicio con alumnado ETCOTE planificados: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Nº informes sesiones inicio con alumnado ETCOTE realizados : 15
<ul style="list-style-type: none"> Nº de cuestionarios de evaluación inicio ETCOTE 1)2010 y 2)2010 planificados: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de cuestionarios de evaluación inicio ETCOTE 1)2008 cumplimentados, recogidos y tabulados: 12
<ul style="list-style-type: none"> Nº de Informes de Evaluación ETCOTE 1)2010 y 2010 planificados: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes de Evaluación ETCOTE realizados: 6
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas de seguimiento a proyectos ETCOTE planificadas: 3 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas de seguimientos a proyectos ETCOTE realizadas: 5
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (área de proyectos) programación 2)2009 previstas: 16 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (área de proyectos) programación 2)2009 realizadas: 15
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (inserción) programaciones 1)2009 y 2)2009 previstas: 17 	<ul style="list-style-type: none"> Nº visitas finalización (inserción) realizadas: 17

7. INDICADORES DE RESULTADOS 3ª FASE

INDICADORES DE RESULTADOS	
PLANIFICADOS	ALCANZADOS
• N° reuniones planificadas con OADL: 24	• N° reuniones realizadas con OADL: 24
• N° Informes trimestrales planificados: 2	• N° Informes trimestrales realizados: 2
• N° Informes semestrales planificados: 1	• N° Informes semestrales realizados: 1
• N° reuniones coordinación técnica de UPD planificadas: 6	• N° reuniones de coordinación técnica UPD realizadas: 24
• N° de asesoramientos solicitados por Entidades Promotoras en esta fase: 4	• N° Asesoramientos a EP realizados en esta fase: 4
• N° asesoramientos solicitados por EP en 2ª fase de UPD: 33	• N° asesoramientos solicitados en 2ª fase de UPD y finalizados en 3ª: 33
• N° cuestionarios satisfacción asesoramientos a EP planificados: 37	• N° de cuestionarios satisfacción asesoramiento a EP enviados: 32
• N° cuestionarios satisfacción asesoramiento a EP recibidos cumplimentados: 23	• N° cuestionarios satisfacción asesoramiento a EP tabulado y analizados: 23
• N° informes viabilidad proyectos ETCOTE solicitados por DGFE: 27	• N° informes viabilidad proyectos ETCOTE realizados: 27
• N° informes valoración proyectos ETCOTE solicitados por DGFE: 24	• N° informes valoración proyectos ETCOTE realizados: 24
• N° sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE planificadas: 6	• N° sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE realizadas: 2
• N° informes sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE planificados: 6	• N° informes sesiones inicio con equipos técnicos ETCOTE realizados: 2
• N° sesiones inicio con alumnado ETCOTE planificadas: 6	• N° sesiones inicio con alumnado ETCOTE realizadas: 2
• N° informes sesiones inicio con alumnado ETCOTE planificados: 6	• N° informes sesiones inicio con alumnado ETCOTE realizados: 2
• N° de cuestionarios de evaluación inicio ETCOTE 2)2010 planificados: 18	• N° de cuestionarios de evaluación inicio ETCOTE 2)2010 cumplimentados, recogidos y tabulados: 10

<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes evaluación inicio ETCOTE planificados: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes evaluación inicio ETCOTE realizados: 6
<ul style="list-style-type: none"> Nº seguimiento PIL planificados: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº seguimiento PIL realizados: 3
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas de seguimiento a proyectos ETCOTE planificadas: 21 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas de seguimientos a proyectos ETCOTE realizadas: 10 (en proceso)
<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes de seguimiento a proyectos ETCOTE Planificados: 21 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes de seguimientos a proyectos ETCOTE realizados: 10 (en proceso)
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (área de proyectos) programación 2)2009 previstas: 1 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (área de proyectos) programación 2)2009 realizadas: 1
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (área de proyectos) programación 1)2010 previstas: 6 	<ul style="list-style-type: none"> Nº visitas finalización (área proyectos) programación 1)2010 realizadas: 5
<ul style="list-style-type: none"> Nº informes finalización (área proyectos) planificados: 7 	<ul style="list-style-type: none"> Nº informes finalización (área proyectos) realizados: 6
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (inserción) programación 2)2009 planificadas: 1 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (inserción) programación 2)2009 realizadas: 0
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (inserción) programación 1)2010 previstas: 6 	<ul style="list-style-type: none"> Nº visitas finalización (inserción) realizadas: 5 (2 en 3ª fase y 3 en 4ª)

8. INDICADORES DE RESULTADOS 4ª FASE

INDICADORES DE RESULTADOS	
PLANIFICADOS	ALCANZADOS
<ul style="list-style-type: none"> Nº reuniones planificadas con OADL: 24 	<ul style="list-style-type: none"> Nº reuniones realizadas con OADL: 24
<ul style="list-style-type: none"> Nº Informes trimestrales planificados: 2 	<ul style="list-style-type: none"> Nº Informes trimestrales realizados: 2
<ul style="list-style-type: none"> Nº Informes semestrales planificados: 1 	<ul style="list-style-type: none"> Nº Informes semestrales realizados: 1
<ul style="list-style-type: none"> Nº reuniones coordinación técnica de UPD planificadas: 6 	<ul style="list-style-type: none"> Nº reuniones de coordinación técnica UPD realizadas: 21
<ul style="list-style-type: none"> Nº de asesoramientos solicitados por Entidades Promotoras en esta fase: 12 	<ul style="list-style-type: none"> Nº Asesoramientos a EP realizados y/o en proceso durante esta fase: 12
<ul style="list-style-type: none"> Nº cuestionarios satisfacción asesoramientos a EP planificados: 12 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de cuestionarios satisfacción asesoramiento a EP enviados: 0

<ul style="list-style-type: none"> Nº seguimiento PIL planificados: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº seguimiento PIL realizados: 3
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas de seguimiento a proyectos ETCOTE planificadas: 8 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas de seguimientos a proyectos ETCOTE realizadas: 8
<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes de seguimiento a proyectos ETCOTE Planificados: 8 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de informes de seguimientos a proyectos ETCOTE realizados: 8
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (área de proyectos) programación 2)2010 y ET 2)2009 previstas: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (área de proyectos) programación 2)2010 y ET 2)2009 realizadas: 18
<ul style="list-style-type: none"> Nº informes finalización (área proyectos) planificados: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº informes finalización (área proyectos) realizados: 18
<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (área inserción) programación 2)2010 y ET 2)2009 previstas: 18 	<ul style="list-style-type: none"> Nº de visitas finalización (área inserción) programación 2)2010 y ET 2)2009 previstas: 18

9. PRODUCTOS Y PUBLICACIONES

9.1.- ESPACIOS EN INTERNET

I.- REDETCO

REDETCO surgió para potenciar y facilitar el trabajo en red de técnicos/as y proyectos del programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo de la provincia de Cáceres. Es, por tanto, una herramienta de comunicación y gestión de proyectos.

Presta sus servicios a través de dos líneas de actuación: cesión de recursos Internet y red social de proyectos.

La **red social** explota una base de datos de proyectos ejecutados y en ejecución, persiguiendo conocer las acciones que se desarrollan en la provincia y apoyar tanto el diagnóstico en el diseño de nuevos proyectos como el funcionamiento de los que se encuentran en activo.

La **cesión de recursos Internet** posibilita la visibilidad de los proyectos en Internet, facilitando la disposición de espacio y correo-e a cada uno de los proyectos, así como el apoyo necesario para utilizar estos recursos.

REDETCO cuenta con su propio dominio en internet - www.redetco.org - organizado en cuatro grandes apartados informativos: mapas de intervención de proyectos, base de datos de proyectos actuales y anteriores, información desde la UPD y proyectos ETCOTE, productos, servicios y herramientas para el uso de los recursos Internet.

2.- PÁGINA WEB DE UPD

La página web corporativa de la UPD. La parte más dinámica se corresponde con los apartados que enlazan a las bibliotecas de documentos de REDETCO. El resto de apartados están relacionados con la información sobre los procesos y servicios que presta la UPD y con información general sobre el programa ETCOTE.

Dirección: <http://www.oadl.es/upd>

3.- BOLETÍN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

A través de la publicación en internet del Boletín de Información Ambiental, los proyectos relacionados con el sector del medio ambiente disponen de información actualizada sobre temas ambientales, recursos y convocatorias que pueden resultar de interés y apoyo al funcionamiento de los citados proyectos.

Dirección: <http://etcote.oadl.es/boletinmedioambiental/>

4.- BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA ADMINISTRACIÓN

Esta página pretende ser un referente para la aplicación de un código de buenas prácticas ambientales, dentro de las actividades relacionadas con el sector de la administración.

Dirección: <http://etcote.oadl.es/medioambiental>

5.- SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN ETCOTE

Página web con orientaciones y recursos para elaborar el ejercicio práctico del módulo de sensibilización ambiental. También contiene el vídeo didáctico sobre sensibilización ambiental en el programa ETCOTE y otros recursos de interés.

Dirección: <http://cbpaetcote.blogspot.com/>

6.- RECURSOS AMBIENTALES

Información relacionada con la búsqueda de bibliografía especializada, lecturas y publicaciones, blogs y páginas web, recursos multimedia, así como a diversos productos y publicaciones de UPD relacionados con el desarrollo de las especialidades formativas ETCOTE medioambientales y la sensibilización y gestión ambiental en el programa.

Dirección: <http://recursosambientales.wordpress.com/>

7.- FORMACIÓN AMBIENTAL PARA EL EMPLEO

El diseño y la elaboración de proyectos ETCOTE relacionados con el sector medioambiental, así como la puesta en marcha y el desarrollo de los mismos por parte de las entidades promotoras requieren de un conocimiento de dicho sector en relación a diversos aspectos que tienen que ver con la formación para el empleo, adaptados al programa ETCOTE.

Dirección: <http://formacionambiental.wordpress.com/>

9.2.- PUBLICACIONES

1.- MANUAL DE COORDINADORES DE FORMACIÓN

Este manual pretende dar a conocer las funciones y competencias de un/a coordinador/a de formación, que dependerán de la realidad del proyecto en sí y por otro lado, se propone la unificación de criterios de planificación y evaluación de la formación para impulsar la calidad de los proyectos ETCOTE y aumentar la calidad de la formación del alumnado-trabajador para que les sea más fácil su incorporación al mundo laboral una vez finalizada la escuela taller, el taller de empleo o la casa de oficio.

2.- GUÍA DIDÁCTICA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN ETCOTE

Guía práctica para formadores, que establece las orientaciones y contenidos para el desarrollo del módulo de sensibilización ambiental, dentro de la formación complementaria que se imparte en el programa ETCOTE.

3.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL MÓDULO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN ETCOTE

Este material está compuesto por los contenidos teóricos correspondientes a los módulos formativos y diversos recursos de apoyo para reforzar la formación impartida: presentaciones en diapositivas, lecturas complementarias, material multimedia, etc.

4.- GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO A ENTIDADES PROMOTORAS DE PROYECTOS ETCOTE

Con esta guía se quiere acompañar a las entidades beneficiarias de un proyecto ETCOTE con un doble objetivo, por un lado, aportar información de utilidad que les permita planificar la ejecución de su proyecto y por otro, proporcionar pautas de intervención para dar respuesta a situaciones que se puedan plantear acerca del alcance de sus responsabilidades y obligaciones.

5.- MANUAL DE ACOGIDA A EQUIPOS TÉCNICOS

El objetivo de esta guía está orientado a proporcionar a los equipos técnicos de los proyectos ETCOTE contenidos conceptuales, así como pautas y recomendaciones con la finalidad de facilitarles la labor en el desarrollo del proyecto, así como en el diseño y elaboración de futuros proyectos.

6.- MANUAL PARA LA TUTORIZACIÓN DE PROYECTOS ETCOTE

Este manual presenta una metodología de acción tutorial con los proyectos ETCOTE en activo de la provincia de Cáceres, de manera que se establezca de una manera sistemática el apoyo técnico, acompañamiento y seguimiento a dichos proyectos, en coordinación con el SEXPE.

7.- AGENDA DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

Destinada al apoyo de la inserción laboral del alumnado de proyectos ETCOTE, es una herramienta que ayudará a ordenar y gestionar toda la información relacionada con las iniciativas de búsqueda de empleo.
